

次世代足場 I q System 点検表



No



点検実施日	年 月 日 ()		
元方事業者			
工事名称			
検査工区			
施工協力会社	作業主任者(職長)		元請確認
点検者	会社名	氏名	
	理由	組立後・一部解体後・変更後・悪天候後・地震後・その他()	

分類	点検項目	点検内容	判定	備考
基礎	基礎の状態	1 地盤面は安定した状態にあるか(目視による)	良 否	
	敷板、敷角(安衛則570条)	2 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか	良 否	
基礎との固定状態	ジャッキベース類	3 ベースは敷板、敷角に正しく固定されているか	良 否	
		4 ジャッキベース類のレベルは正しいか	良 否	
支柱とジャッキベース	ジャッキベース	5 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか	良 否	
		6 ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか	良 否	
滑動防止	根がらみ (安衛則570条)	7 桁行方向に2スパン以上根がらみの無いスパンがないか	良 否	
		8 敷板にジャッキベースを釘止めしない場合:根がらみは直角方向に取り付けられているか	良 否	
		9 敷板にジャッキベースを釘止めする場合:敷板と直角方向に根がらみが設けられているか	良 否	
		10 根がらみ用布材のくさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
支柱の接続	抜け止め処置	11 支柱のロックピンが確実にロックされているか	良 否	
支柱の間隔	支柱(安衛則571条)	12 支柱の設置間隔は指定通りか(185cm以下か)	良 否	
作業床	床付き布わく (安衛則563条)	13 指定通りの幅の床付き布わくが設置されているか	良 否	
		14 つかみ金具の外れ止めはロックされているか	良 否	
		15 床材間の隙間は3cm以下か(床材は幅40cm以上、建地との隙間は12cm未満か)	良 否	
布材、ブラケット等	設置状態 (安衛則563条)	16 くさびは正しく打ち込まれているか	良 否	
		17 布材等の設置位置は指定通りか	良 否	
先行手すり	設置状態 (安衛則563条)	18 設置位置は指定通りか	良 否	
		19 取付部のくさびの緩みはないか	良 否	
		20 先行手すりを使用していない場合、大筋かいが取り付けられているか	良 否	
躯体との固定	壁つなぎ (安衛則570条)	21 垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか	良 否	
		22 躯体側、足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか	良 否	
昇降設備	階段等 (安衛則526条)	23 安全に昇降できる昇降設備が設けられているか	良 否	
		24 階段手すり及び階段開口部手すりは設置されているか	良 否	
		25 踊り場は2層以下毎に設置されているか	良 否	
開口部	梁枠等	26 梁枠を用いた開口の高さは3層以下か	良 否	
		27 梁枠の外方1スパンには最下層から梁枠のレベルまで各層に先行手すりが設置されているか	良 否	
		28 梁枠を支持する支柱から外方に1スパン以上設置されているか	良 否	
		29 梁枠の両端支持部の支柱には壁つなぎが設けられているか	良 否	
		30 梁枠間の水平面に床付き布わくを設け水平構を形成しているか	良 否	
安全設備等	転落・墜落防護工(安衛則563条)	31 転落・墜落のおそれのある場所に、手すりや安全ネット、巾木等が設置されているか	良 否	
外観検査	垂直方向	32 支柱は垂直に組みあがっているか	良 否	
	水平方向	33 通りや水平は正しく出ているか	良 否	
	不良部材(安衛則559条)	34 著しい変形や破損のある不良部材を使用していないか	良 否	
最終確認	組立図	35 部品の組み忘れはないか	良 否	
		36 組立図通りに部材の配置、取付が行われているか	良 否	

(注意) この点検は今後の安全を保障するものではありません。

Ver.20240226

次世代足場「I qシステム」足場点検のポイント

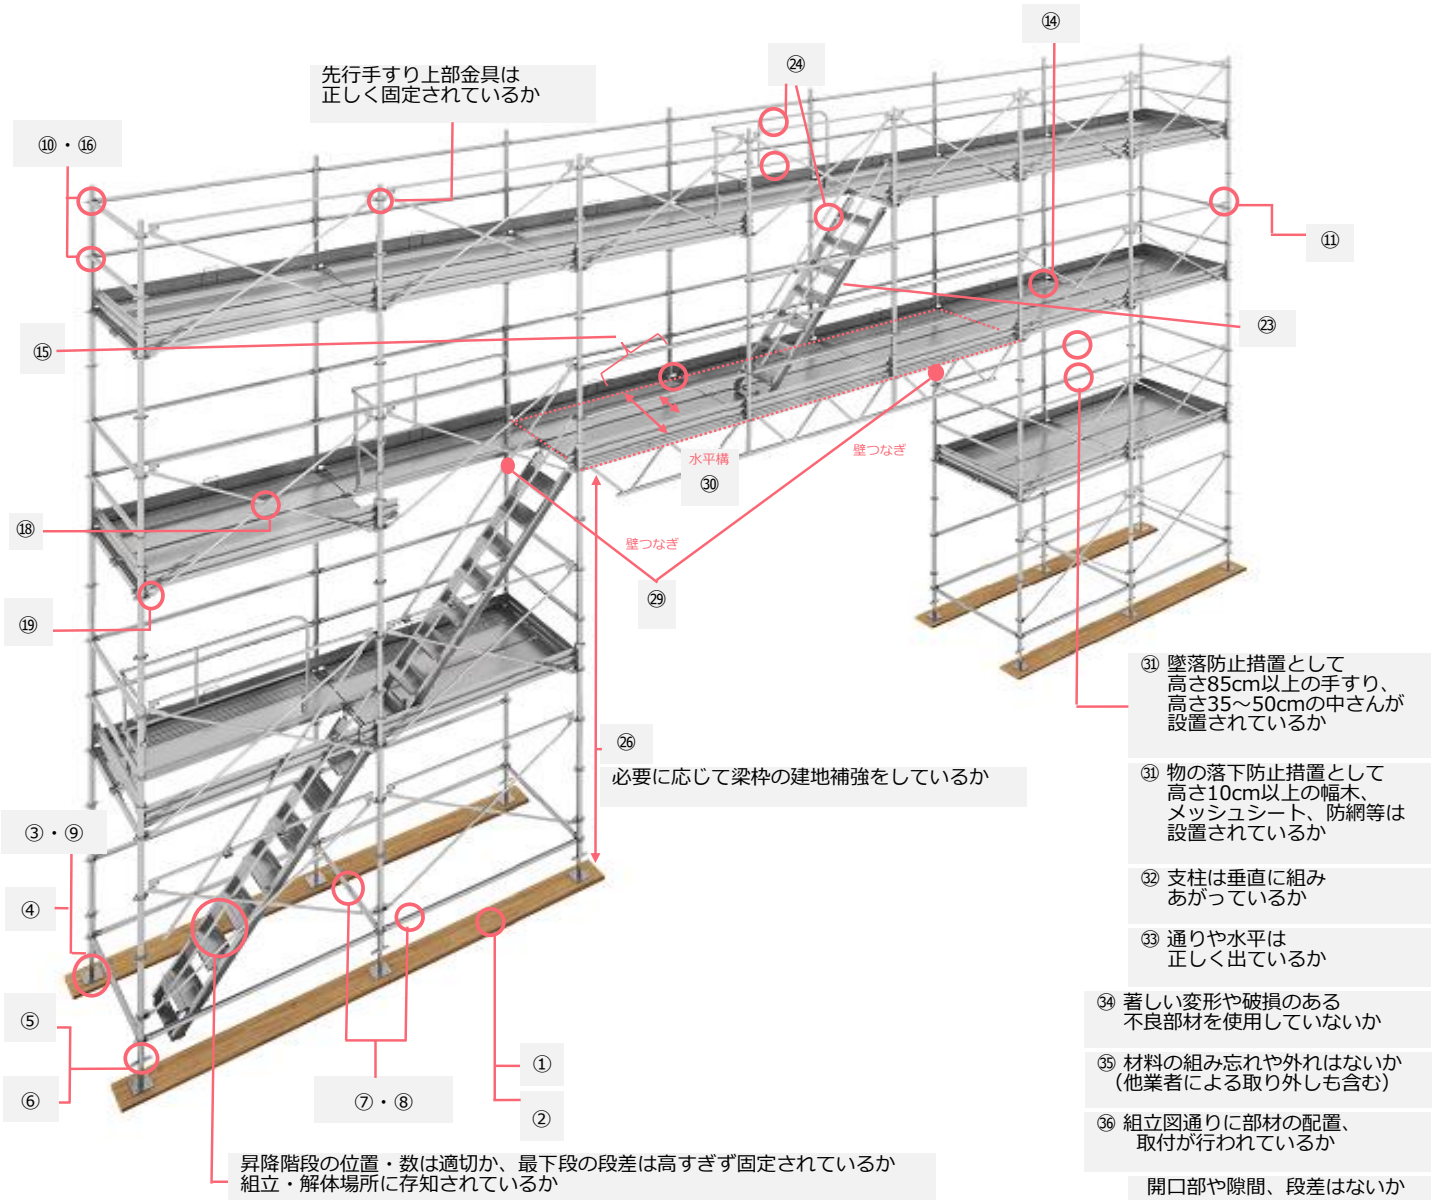

※数字 (①...) は、足場組立て後等の点検表 (次世代足場 I q S Y S T E M) の点検内容

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① 地盤面は安定した状態にあるか (敷板、敷角等は沈下していないか) ② 地面上に建てる場合、敷板、敷角を使用しているか ③・⑨ 敷板、敷角は正しく固定 (対角に釘止め) されているか ④ ジャッキベース類のレベルは正しいか ⑤ 支柱は正しくジャッキベースに差し込まれているか ⑥ ジャッキハンドルと支柱下端の間に遊びはないか ⑦・⑧ 根がらみは桁行方向、梁間方向の2方向に設置されているか ⑩・⑯ 手すりのくさびは正しく打ち込まれているか ⑪ 支柱接続部のロックピンは正しくロックされているか ⑫ 支柱の設置間隔は指定通りか (上記記載なし) ⑬ 指定通りの幅の床付き布わくが設置されている (上記記載なし) ⑭ 鋼製布板のつかみ金具の外れ止めはロックされているか ⑮ 床材間の隙間は3cm以下、作業床の幅40cm以上、床材と建地との隙間は12cm未満になっているか ⑰ 布材等の設置位置は指定通りか (上記記載なし) | <ul style="list-style-type: none"> ⑱ 先行手すり設置位置は指定通りか (上記記載なし) ⑲ 先行手すり下部くさびの緩みはないか ⑳ 先行手すりを使用していない場合、大筋かいが取付けられているか ㉑ 壁つなぎ・控えは、垂直水平方向とも指定通りの間隔で設置されているか (上記記載なし) ㉒ 壁つなぎ・控えは、躯体側、足場側ともに堅固な位置に正しく固定されているか (上記記載なし) ㉓ 安全に昇降できる昇降設備が設けられているか ㉔ 階段手すり及び階段開口部手すりは設置されているか ㉕ 踊り場は2層以下毎に設置されているか (上記記載なし) ㉖ 梁枠を用いた開口の高さは3層以下か ㉗ 梁枠の外方1スパンには最下層から梁枠のレベルまで各層に先行手すりが設置されているか (上記記載なし) ㉘ 梁枠を支持する支柱から外方に1スパン以上設置されているか (上記記載なし) ㉙ 梁枠の両端支持部の支柱には壁つなぎが設けられているか ㉚ 梁枠間の水平面に床付き布わくを設け水平構を形成しているか |
|---|--|
